


Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL

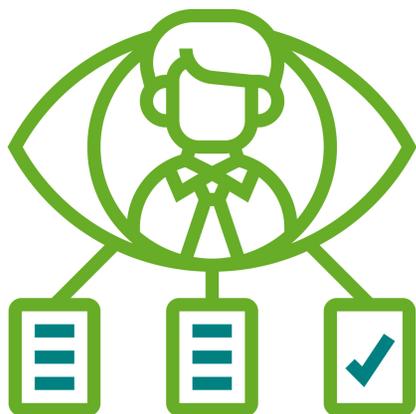

PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO  
A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS  
VIGILADOS A NIVEL NACIONAL

## Objetivo general:


Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control a los vigilados por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Código BPIN: 2018011000655

Sector: Transporte

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Entidad: SUPERTRANSPORTE  
 Responsable: Jefferson Ferney Ramirez Bustos  
 Horizonte: 2019 - 2024  
 Presupuesto 2021: \$ 7.667.721.848  
 Control Posterior: 24/11/2021  
 Seguimiento de: septiembre 2021

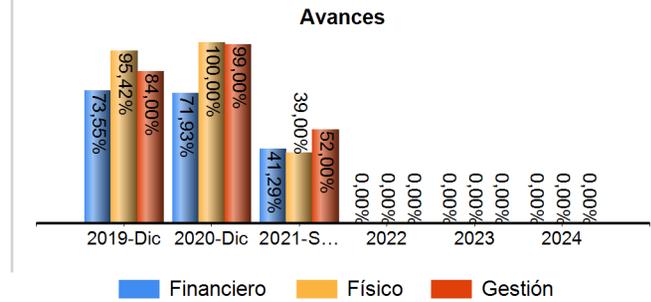

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

PRODUCTOS					
Documentos de investigación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	24,0000	0,0000	20,0000	7,0000	35,00 %
<b>Observaciones :</b> Generación de 7 tableros de control y analítica de datos descriptiva en producción de los proyectados para la vigencia: SASPRO CONCESIONES, SASPRO PUERTOS, INDICADORES ABC, TRAFICO PORTUARIO FASE II, TRAFICO PORTUARIO - DNP. Un total de 17 Tableros en funcionamiento.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Procesar y divulgar información del Sector	PGN	\$621.701.605	\$121.701.605	\$35.253.333	
Revisar y analizar la información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adecuar, Suministrar y Dotar el Centro de Control de Monitoreo de Actividades de Transporte.	PGN	\$0	\$115.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$621.701.605</b>	<b>\$236.701.605</b>	<b>\$35.253.333</b>	

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

PRODUCTOS
Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.301,0000	0,0000	1.301,0000	644,0000	49,50 %
<b>Observaciones :</b> Se han gestionado 644 Aperturas de investigación y decisiones de fondo.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar y Planear acciones de auditoria y control.	PGN	\$500.000.000	\$500.000.000	\$123.662.966	
Realizar acciones de auditoria y control.	PGN	\$2.313.213.579	\$2.518.213.579	\$1.416.355.916	
Elaborar informes de las acciones de auditoria y Control.	PGN	\$435.222.836	\$435.222.836	\$247.018.553	
Diseñar las investigaciones.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar las investigaciones.	PGN	\$1.921.646.320	\$1.921.646.320	\$1.068.028.265	
Sistematizar las investigaciones.	PGN	\$188.732.386	\$188.732.386	\$7.452.667	
Implementar herramientas y servicios de atención al ciudadano que le faciliten el acceso al servicio de supervisión.	PGN	\$63.300.000	\$243.300.000	\$76.500.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$5.422.115.121</b>	<b>\$5.807.115.121</b>	<b>\$2.939.018.367</b>	
Documentos de planeación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se realiza los primeros procesos de contratación para levantamiento de información de programas especiales de supervisión.					

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diagnosticar necesidades de diseño de políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar y evaluar políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$1.437.900.391	\$1.437.900.391	\$159.248.479
Socializar, divulgar y brindar acompañamiento sobre las políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$186.004.731	\$186.004.731	\$32.830.600
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.623.905.122</b>	<b>\$1.623.905.122</b>	<b>\$192.079.079</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	12.000.000.000	12.000.000.000	11.000.000.000	9.707.054.975	8.090.510.214	8.090.510.214	Financiero 73,55% Físico 100,00% Gestión 84,00%
2020-Dic	12.360.000.000	8.052.000.000	7.252.000.000	6.345.815.004	5.216.290.028	4.793.175.246	Financiero 71,93% Físico 100,00% Gestión 99,00%
2021-Sep	8.301.612.000	7.667.721.848	7.667.721.848	6.740.002.522	3.166.350.779	3.155.847.779	Financiero 41,29% Físico 39,00% Gestión 52,00%
2022	7.257.280.776	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	8.487.700.553	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2024	8.742.331.542	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	7.667.721.848	7.667.721.848	6.740.002.522	3.166.350.779	3.155.847.779	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	7.667.721.848	7.667.721.848	6.740.002.522	3.166.350.779	3.155.847.779	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	7.667.721.848	7.667.721.848	6.740.002.522	3.166.350.779	3.155.847.779	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>7.667.721.848</b>	<b>7.667.721.848</b>	<b>6.740.002.522</b>	<b>3.166.350.779</b>	<b>3.155.847.779</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,63 %	4,22 %	9,62 %	15,56 %	21,66 %	27,95 %	34,40 %	41,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,00 %	14,00 %	14,00 %	37,00 %	37,00 %	39,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,00 %	52,00 %	52,00 %	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Innovación	Recursos Propios	2.351.318.266	425.433.991	133.227.000	42.706.000	41.693.818
Total			2.351.318.266	425.433.991	133.227.000	42.706.000	41.693.818
Actividades de ciencia, tecnología e innovación							
Total							
Actividades de ciencia, tecnología e innovación							
Total							

> Metas de Producto (BIS)

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

**PRODUCTOS**

Documentos de investigación

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Estudios realizados para apoyar la regulación y supervisión de transporte	100,00 %	12,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones:</b> En curso ejecución de procesos contractuales para soporte y levantamiento de requerimientos de los servicios de información.								

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

**PRODUCTOS**

Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Modelos de buenas prácticas empresariales implementadas	100,00 %	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones:** Apoyo en la construcción de requisitos funcionales y no funcionales del índice de servicio en aspectos de Normas Internacionales de la Información Financiera y Societarios.

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Auditorías a las entidades vigiladas realizadas	3.000	1.545,00	51,50 %

**Observaciones:** Al corte del Julio se han realizado total de 1545 acciones de supervisión durante el periodo.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	7.667.721.848	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	41,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655
